

Gestione della Non Emergenza

Attivazione sperimentale del Servizio 116117

Attività svolta con contributo POR-FESR Sardegna 2014-2020



RELAZIONE DI SAL N. 3

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste sul Progetto dei Fabbisogni trasmesso da Almviva Spa, aggiudicatario del Contratto Quadro SPC – Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi online”, con comunicazione prot. PG/2018/266406 del 09/07/2018, come da paragrafo “3.12 – Quadro riassuntivo dei servizi”.

Lotto 4		RAS - Azienda Tutela Salute 116117							€	1.844.267,50
Cod. Serv.	Nome Servizio	Tipologia di erogazione	Metrica di pricing	Modalità di erogazione	Modalità di consuntivazione	intervallo temporale di riferimento	Prezzo unitario offerto (€)	quantità necessarie	valore economico	
L4.S1	A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web	As a Service/On Premise	FP o gg/pp	Progettuale	A corpo	na			€ 917.366,40	
L4.S1.1bis	<i>Ciclo Completo (gg/pp)</i>	<i>As a Service/On Premise</i>	<i>gg/pp</i>	<i>Progettuale</i>	<i>A corpo</i>	<i>na</i>	€ 192,32	4.770,0	€ 917.366,40	
L4.S3	C) Content management	On Premise/As a Service	gg/pp	Continuativa	A canone	giornaliero	€ 187,40	1.190,0	€ 223.006,00	
L4.S4	D) Gestione Operativa	As a Service	istanza	Continuativa	A canone	trimestrale			€ 236.250,00	
L4.S4.3	Gestione Operativa (fascia Alta)	As a Service	istanza	Continuativa	A canone	trimestrale	€ 11.250,00	21,0	€ 236.250,00	
L4.S5	E) Manutenzione correttiva/adequativa siti web, portali e applicazioni web	As a Service/On Premise	FP o gg/pp	Continuativa	A canone				€ 146.330,40	
L4.S5.1	E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC (FP)	As a Service/On Premise	FP (MAC)	Continuativa	A canone	mensile	€ 0,50	270.000,0	€ 135.000,00	
L4.S5.2	E) Manutenzione adeguativa siti web, portali e applicazioni web MAD (gg/pp)	As a Service/On Premise	gg/pp (MAD)	Continuativa	A canone	giornaliero	€ 188,84	60,0	€ 11.330,40	
L4.S6	F) Conduzione applicativa	On Premise	gg/pp	Continuativa	A canone	giornaliero	€ 189,64	480,0	€ 91.027,20	
L4.S7	G) Supporto specialistico	On Premise	gg/pp	Progettuale	A consumo	giornaliero	€ 204,70	1.125,0	€ 230.287,50	

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori si è provveduto allo svolgimento delle attività di verifica nei giorni 09, 10 e 11 giugno 2020. Il dettaglio delle attività svolte nelle giornate suddette è riportato nei Verbali di Riunione relativi al Progetto - “Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 116117” – rispettivamente con protocollo PG/2020/140057 del 19/06/2020, PG/2020/140065 del 19/06/2020 e PG/2020/140070 del 19/06/2020.


Si prende atto dell'esito delle attività succitate, incluso l'esito positivo dell'attività relativa a "Azione di Change Management" completata - in seguito alle segnalazioni riportate dal Gruppo di Lavoro nel corso della seduta di SAL del 11/06/2020 (Resoconto Riunione - PG/2020/140070 del 19/06/2020) - nell'incontro con la RTI del 16/06/2020 (Resoconto Riunione - PG/2020/0144272 del 24/06/2020), e consolidata in seguito alla trasmissione dei deliverables da parte del RTI nella stessa giornata (PG/2020/0137515 del 17/06/2020).

Richiamato quanto sopra riportato si propone l'approvazione dello "Stato Avanzamento Lavori al 24/06/2020" sottoscritto e trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 26/06/2020 (PG/2020/0145808 del 26/06/2020).

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi presenti nella suddetta proposta in corrispondenza della colonna "SAL 3". Tali importi, sommati a quelli già approvati per il "SAL 1" con Determinazione Dirigenziale N° 9309 del 07/11/2018 e per il "SAL 2" con Determinazione Dirigenziale N° 8336 del 07/11/2019, vengono portati in detrazione al valore economico presente sul Progetto dei Fabbisogni, il risultato è indicato nella colonna "RESIDUO".

STATO AVANZAMENTO LAVORI al 24/06/2020 (approvazione proposta SAL3 - PG/2020/144745 del 25/06/2020)											
Cod. Serv.	Nome Servizio	Valore economico TOTALE (IVA esclusa)	SAL 1 (IVA esclusa)	SAL 2 (IVA esclusa)	SAL 3 (IVA esclusa)	RESIDUO (IVA esclusa)	% avanzamento SAL 1	% avanzamento SAL 2	% avanzamento SAL 3	% avanzamento TOTALE	
L4.S1	A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web	917.366,40 €	353.099,52 €	31.348,16 €	39.694,85 €	493.223,87 €	38%	3%	4%	46%	
L4.S1.1bis	Ciclo Completo (gg/pp)	917.366,40 €	353.099,52 €	31.348,16 €	39.694,85 €	493.223,87 €	38%	3%	4%	46%	
L4.S3	C) Content management	223.006,00 €	- €	2.998,40 €	11.693,76 €	208.313,84 €	0%	1%	5%	7%	
L4.S4	D) Gestione Operativa	236.250,00 €	- €	29.250,00 €	28.350,00 €	178.650,00 €	0%	12%	12%	24%	
L4.S4.3	Gestione Operativa (fascia Alta)	236.250,00 €	- €	29.250,00 €	28.350,00 €	178.650,00 €	0%	12%	12%	24%	
L4.S5	E) Manutenzione correttiva/adequativa siti web, portali e applicazioni web	146.330,40 €	- €	- €	- €	146.330,40 €	0%	0%	0%	0%	
L4.S5.1	E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC (FP)	135.000,00 €	- €	- €	- €	135.000,00 €	0%	0%	0%	0%	
L4.S5.2	E) Manutenzione adeguativa siti web, portali e applicazioni web MAD (gg/pp)	11.330,40 €	- €	- €	- €	11.330,40 €	0%	0%	0%	0%	
L4.S6	F) Conduzione applicativa	91.027,20 €	- €	- €	- €	91.027,20 €	0%	0%	0%	0%	
L4.S7	G) Supporto specialistico	230.287,50 €	7.983,30 €	47.695,10 €	15.352,50 €	159.256,60 €	3%	21%	7%	31%	
TOTALE		1.844.267,50 €	361.082,82 €	111.291,66 €	95.091,11 €	1.276.801,91 €	20%	6%	5%	31%	

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento, espresso come valore percentuale, delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.

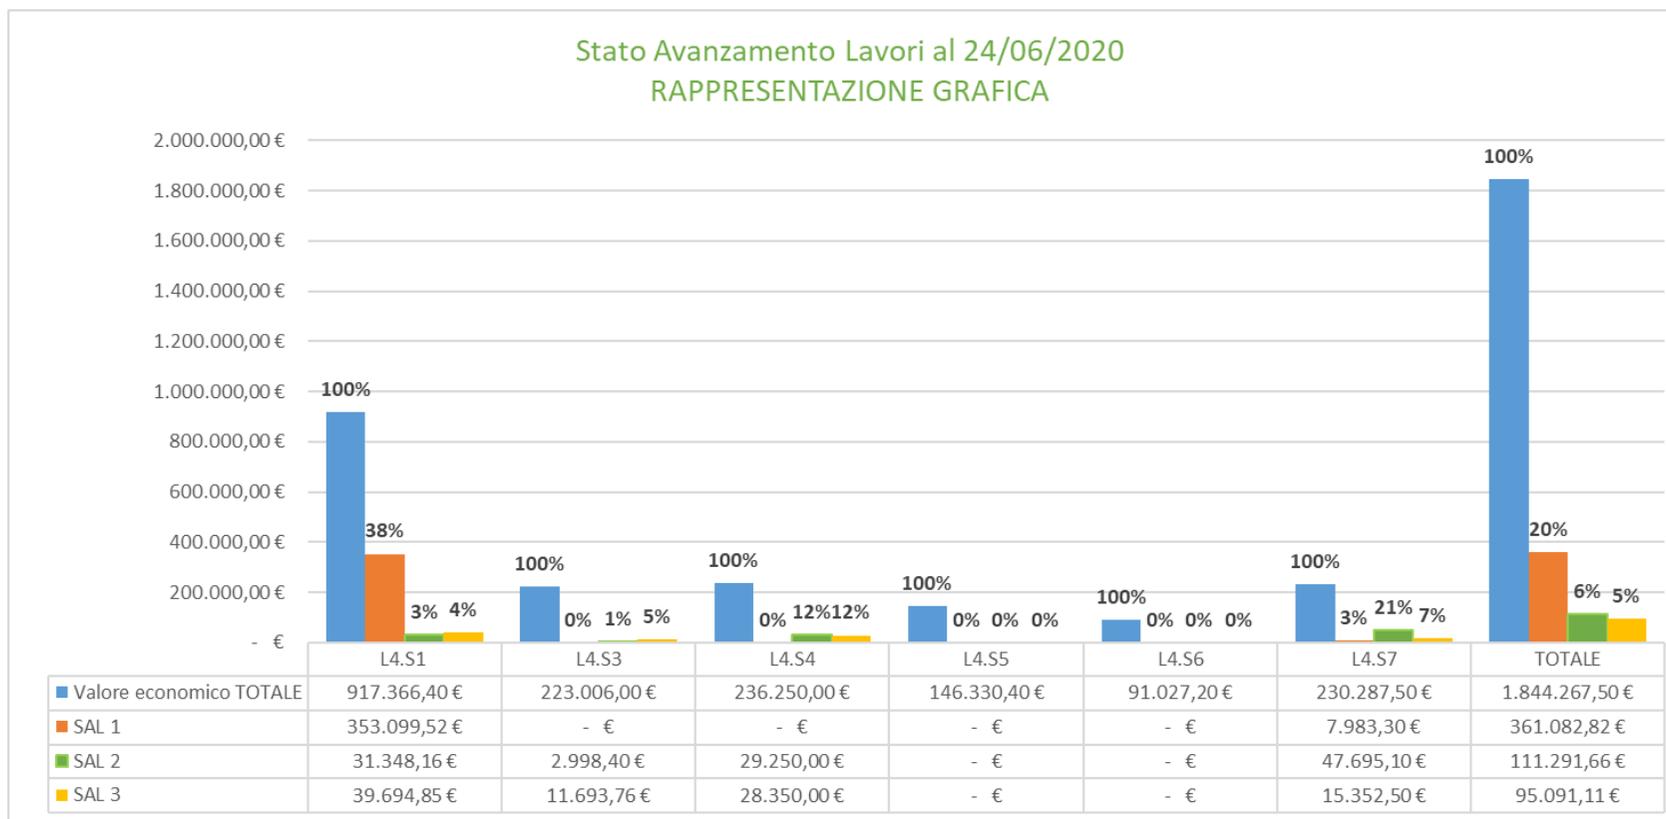

Sassari 26/06/2020

Il Direttore Esecuzione Lavori
Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Piergiorgio Annicchiarico
