

***Servizio di supporto consulenziale al Project Management
delle iniziative progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie***

Attività svolta con contributo POR-FESR Sardegna 2014-2020



RELAZIONE DI SAL N. 3

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste sull'offerta economica trasmesso dalla ditta Business Integration Partners SpA, aggiudicatario del Servizio di supporto consulenziale al Project Management delle iniziative progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie, aggiudicata in via definitiva con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari N° 5822 del 23/07/2019.

Linea di attività/Servizio	Valore Economico Totale (IVA esclusa)
SOTTOPROGETTO-1 - <i>Attivazione sperimentale del numero 116117</i>	59.391,38 €
SOTTOPROGETTO-2 - <i>CDR-XDS</i>	49.935,98 €
SOTTOPROGETTO-3 - <i>Realizzazione del portale di accesso alle cure primarie</i>	29.122,64 €
TOTALE	138.450,00 €

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori si è analizzata la relazione presentata dalla ditta Business Integration Partners SpA, allegata alla Fattura PA20-0220 del 30/06/2020, nella quale vengono dettagliate le attività di supporto erogate relativamente alle tre linee progettuali e in accordo alle metodologie proposte in fase di gara.

- **SOTTOPROGETTO-1** - Attivazione sperimentale del numero 116117.

Il suddetto sottoprogetto è stato avviato a settembre 2018 in seguito all'Adesione all'Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 ("Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line" – Progetto "Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 116117") e all'attivazione delle altre iniziative progettuali ad esso correlate ed è tuttora in corso.

La ditta BIP SpA, in seguito all'aggiudicazione definitiva del servizio consulenziale, ha fornito il necessario supporto ad ATS per:

- la valutazione delle ripianificazioni proposte dal Fornitore aggiudicatario del sottoprogetto-1;
- la valutazione dei deliverable prodotti;
- operare, su delega specifica della Stazione Appaltante, come interfaccia tra ATS e i fornitori;
- la revisione della scheda progetto relativa al sottointervento 1 e al progetto SICP in coerenza con il riorientamento definito;
- la rimodulazione dei piani di fatturazione e nello svolgimento delle attività di SAL di metà giugno 2020, ai fini di valutare la proposta di avanzamento del fornitore e verificare l'effettivo stato di avanzamento lavori;
- la valutazione degli impatti sulla pianificazione di progetto delle misure messe in atto per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Nell'ambito del riorientamento iniziative progettuali per attività di supporto all'emergenza sanitaria COVID-19, la Ditta BIP SpA, ha supportato ATS nella definizione e valutazione dello scenario di riconfigurazione dei servizi e sistemi del sottoprogetto-1 (Attivazione sperimentale del numero 116117) per il supporto dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19.

In particolare quest'ultima attività, legata al riorientamento del sottoprogetto-1, per individuare una soluzione a supporto dell'emergenza sanitaria in atto, ha comportato un utilizzo di risorse non previste inizialmente nel progetto. Il valore di questa attività di supporto ammonta a € 9.789,00 (pari a circa il 66% dell'importo maturato, durante il trimestre, sul sottoprogetto-1).

- **SOTTOPROGETTO-2** - CDR-XDS.

Il suddetto sottoprogetto è stato avviato a maggio 2019 in seguito all'Adesione all'Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 3 ("Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa" finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura di Clinical Document Repository per il Sistema Informativo delle Cure Primarie) e, come per il sottoprogetto-1, la ditta BIP SpA ha fornito il supporto specificato nella relazione allegata. In questo caso l'attività è limitata all'aggiornamento e manutenzione del piano di progetto in coerenza con le dipendenze/propedeuticità tra le varie attività relative alle altre progettualità.

- **SOTTOPROGETTO-3** - Realizzazione del portale di accesso alle cure primarie.

La fase realizzativa del sottoprogetto-3 non è stata ancora aggiudicata.

La ditta BIP SpA, in questa fase preliminare, ha supportato ATS per l'attività di definizione del perimetro dell'intervento e dei macro-processi di riferimento. In particolare, nel secondo trimestre 2020, ha contribuito significativamente alla revisione della scheda progetto relativa al sottointervento 3 e al progetto SICP in coerenza con il riorientamento necessario per affrontare l'emergenza sanitaria in corso.

Nell'ambito del riorientamento delle iniziative progettuali per attività di supporto all'emergenza sanitaria COVID-19, la ditta Business Integration Partners SpA ha supportato ATS:

- nella definizione dello scenario di riconfigurazione dei servizi del sottoprogetto 3 e degli elementi caratterizzanti il riorientamento (oggetto, perimetro, destinatari, durata, ...);
- nella valutazione dei possibili scenari di servizio (es. in termini di estensione delle soluzioni e modalità di introduzione);
- nella definizione dei requisiti tecnico-funzionali relativi al riorientamento per il supporto all'emergenza sanitaria e dei livelli di servizio per i servizi oggetto del riorientamento;
- nella valutazione, in coerenza con gli scenari di servizio, dei volumi dell'iniziativa e del dimensionamento economico del riorientamento;
- nella stesura della documentazione necessaria all'approvvigionamento di una piattaforma di sorveglianza attiva in linea con gli elementi funzionali, tecnici ed economici definiti.

Tale attività ha comportato un utilizzo di risorse non previste inizialmente nel progetto.

Il valore di questa attività di supporto ammonta a € 14.243,00 (pari a circa il 91% dell'importo maturato, durante il trimestre, sul sottoprogetto-3).

La quota imputata al sottoprogetto-3 eccede, per una quota pari a € 8.908,36, quanto inizialmente stimato in fase di definizione del servizio.

Di conseguenza, tenuto conto dell'eccezionalità del contesto di emergenza sanitaria, che ha richiesto un sovra impegno di risorse relativamente al sottoprogetto-3, si conviene, sentito il Dr. Emiliano Deplano (DEC del sottoprogetto-2 secondo quanto riportato sulla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 124 del 14/02/2019) ed in seguito all'approvazione del Dr. Annicchiarico (RUP dei sottoprogetti 1 e 2 nonché RUP del contratto relativo al Servizio di supporto consulenziale al Project Management delle iniziative progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie), di rimodulare le quote inizialmente definite imputando la quota eccedente su evidenziata (paria a € 8.908,36) sul residuo disponibile del sottoprogetto-2.

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi presenti nella proposta della Ditta BIP Spa in corrispondenza della colonna "SAL 3". Tali importi, sommati a quelli già approvati per il "SAL 1" con Determinazione Dirigenziale N° 2046 del 17/04/2020 e per il "SAL 2" con Determinazione Dirigenziale n. 3392 del 07/07/2020, vengono portati in detrazione al valore economico presente sull'Offerta Economica aggiudicata in via definitiva con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari N° 5822 del 23/07/2019 e, il risultato, è indicato nella colonna "RESIDUO".

Linea di attività/Servizio	Valore economico TOTALE (IVA esclusa)	SAL 1	SAL 2	SAL 3	RESIDUO	% avanzamento SAL 1	% avanzamento SAL 2	% avanzamento SAL 3	% avanzamento TOTALE
SOTTOPROGETTO-1 <i>Attivazione sperimentale del numero 116117</i>	59.391,38 €	13.366,00 €	17.487,00 €	14.921,00 €	13.617,38 €	23%	29%	25%	77%
SOTTOPROGETTO-2 <i>CDR-XDS</i>	49.935,98 €	6.744,00 €	3.642,00 €	337,00 €	39.212,98 €	14%	7%	1%	21%
SOTTOPROGETTO-3 <i>Realizzazione del portale di accesso alle cure primarie</i>	29.122,64 €	13.516,00 €	8.920,00 €	15.595,00 €	- 8.908,36 €	46%	31%	54%	131%
TOTALE	138.450,00 €	33.626,00 €	30.049,00 €	30.853,00 €	43.922,00 €	24%	22%	22%	68%

Applicata la rimodulazione descritta precedentemente si ottiene il quadro riepilogativo riportato nella tabella di seguito:

Linea di attività/Servizio	Valore economico TOTALE (IVA esclusa)	SAL 1	SAL 2	SAL 3	RESIDUO	% avanzamento SAL 1	% avanzamento SAL 2	% avanzamento SAL 3	% avanzamento TOTALE
SOTTOPROGETTO-1 <i>Attivazione sperimentale del numero 116117</i>	59.391,38 €	13.366,00 €	17.487,00 €	14.921,00 €	13.617,38 €	23%	29%	25%	77%
SOTTOPROGETTO-2 <i>CDR-XDS</i>	49.935,98 €	6.744,00 €	3.642,00 €	(*) 9.245,36 €	(*) 30.304,62 €	14%	7%	(*) 19%	(*) 39%
SOTTOPROGETTO-3 <i>Realizzazione del portale di accesso alle cure primarie</i>	29.122,64 €	13.516,00 €	8.920,00 €	(**) 6.686,64 €	(**) - €	46%	31%	(**) 23%	(**) 100%
TOTALE	138.450,00 €	33.626,00 €	30.049,00 €	30.853,00 €	43.922,00 €	24%	22%	22%	68%


(*) È stata portata in detrazione, alla quota disponibile sul sottoprogetto-2, la quota eccedente del sottoprogetto-3 (pari a € 8.908,36) che, sommata a quella di competenza del sottoprogetto-2 (pari a € 337,00), totalizza un importo pari a € 9.245,36.

(**) È stata portata in detrazione una quota pari al residuo disponibile sul sottoprogetto-3 (pari a € 6.686,64) a fronte di una competenza pari a € 15.595,00. La parte rimanente (pari a € 8.908,36) viene imputata sul residuo del sottoprogetto-2.

Richiamato quanto sopra riportato si propone l'approvazione della "Relazione sulle attività svolte da Bip S.p.A. nell'ambito del contratto per il "Servizio di supporto consulenziale al Project Management" (allegata alla Fattura PA20-0220 del 30/06/2020) allegata alla presente "Relazione di SAL N.3"

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento, espresso come valore percentuale, delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.

Stato Avanzamento Lavori al 30/06/2020
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

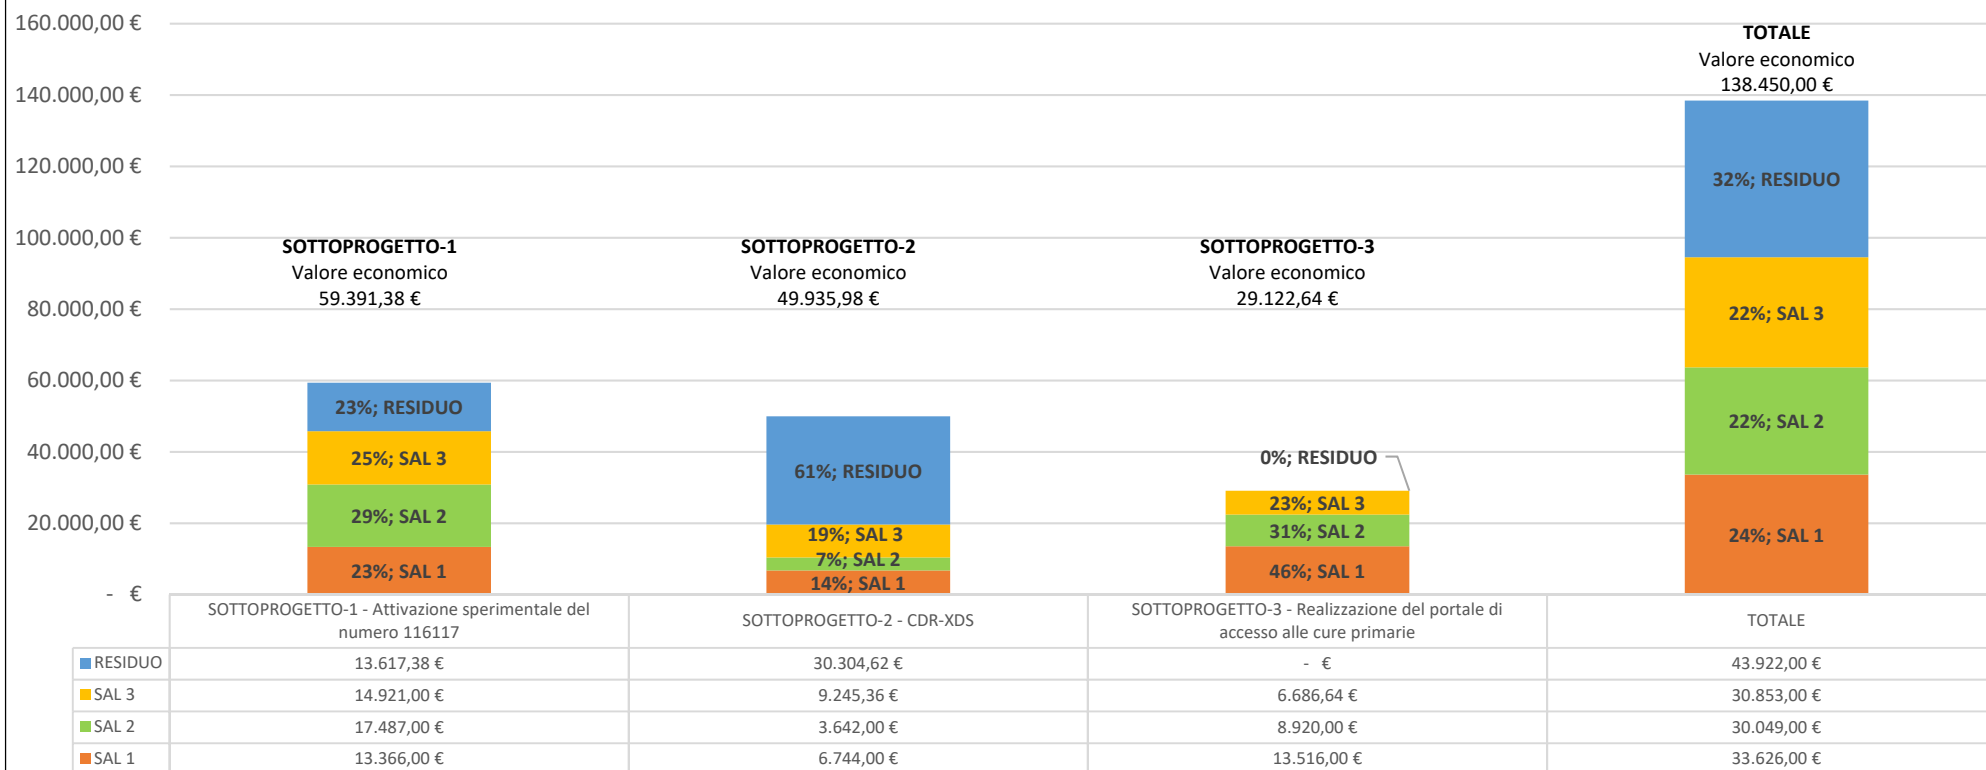

Ozieri 20/07/2020

Il Direttore Esecuzione Lavori
Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Piergiorgio Annicchiarico
